


# Innviðaátakið Innviðir2020 Norðurland vestra

Kynning á ársfundi Samtaka sveitarfélaga á  
norðurlandi vestra  
16.apríl 2021

Dóra Hjálmarsdóttir



# Uppbygging innviða

## Staða aðgerða 2020/2021


- Í desember 2019 í kjölfar óveðursins sem gekk yfir landið var stofnaður átakshópur sex ráðuneyta til vinnslu á tillögum til úrbóta á innviðum
- Í lok febrúar 2020 voru gefnar út aðgerðalýsingar með niðurstöðum hópsins
- Í lok árs 2020 var framvinda og staða aðgerðanna könnuð
- Aðgerðum á útgefnum framkvæmdaáætlunum var almennt ekki fylgt eftir (samgönguáætlun, fjarskiptaáætlun, o.fl.)
- Næsta uppfærsla er áætluð um áramót 2021/2022
- Hér á eftir fer yfirlit yfir stöðu aðgerða um áramót með uppfærslu þar sem tók voru á

# Aðgerðir á Norðurlandi vestra


- Alls 54 aðgerðir
  - Sérstök uppbygging 25 aðgerðir
  - Opinberar áætlanir 29 aðgerðir
- Aðgerðir eru:
  - Bein afleiðing óveðursins – rauðar – (20)
  - Flýting vegna óveðursins – gular – (4)
  - Uppbygging óháð óveðrinu – appelsínugular – (1)
  - Aðgerðir á áætlunum óháð óveðrinu – hvítar – (29)
- Aðgerðir vegna óveðursins eru:
  - Skammtímaaðgerðir - lokið árið 2020 (7)
  - Langtímaaðgerðir - lokið árið 2021 eða síðar (18) þar af 2 áætlað lokið 2022-2024
- Sérstakt fjárfestingaátak vegna uppbyggingar
- COVID-19 hefur haft veruleg áhrif á framvindu aðgerða



# Framvinda - landshlutar

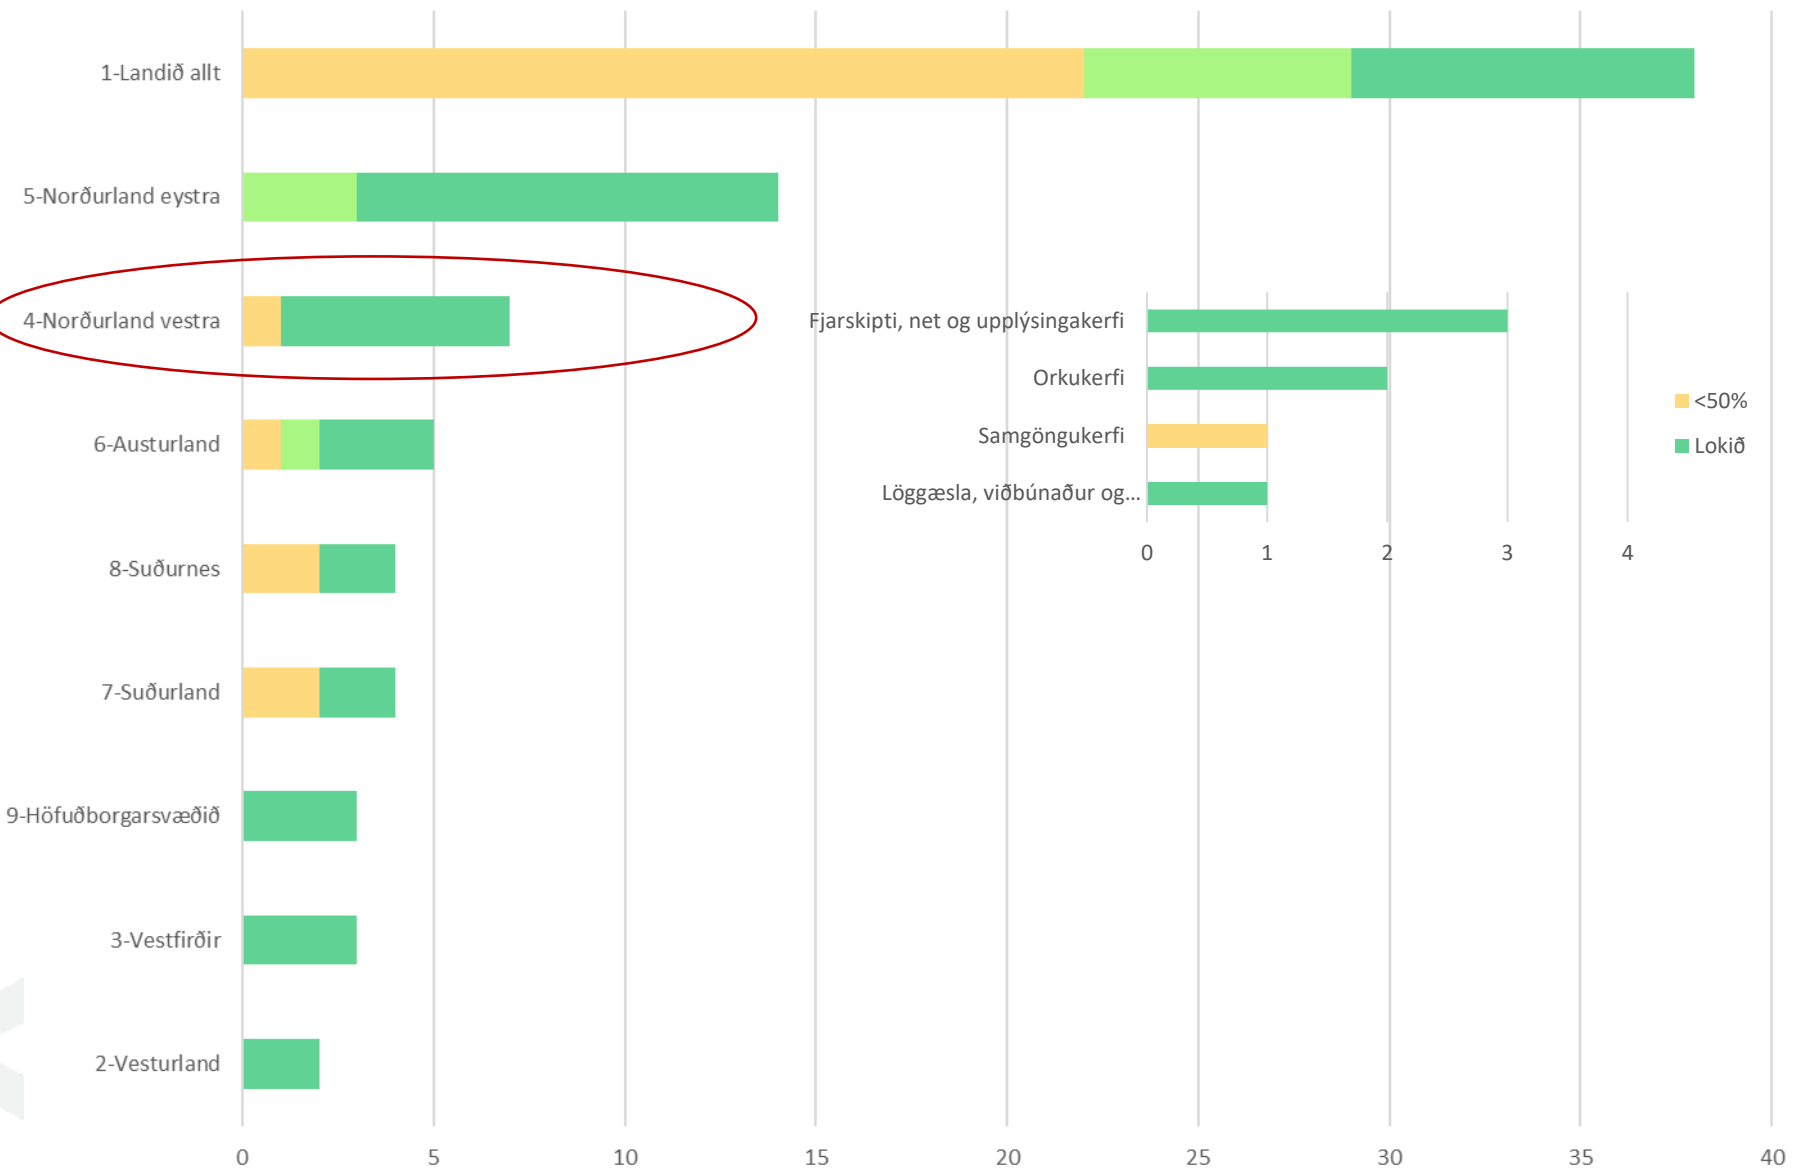

Skammtímaáðgerðir  
Hefjast og lýkur 2020

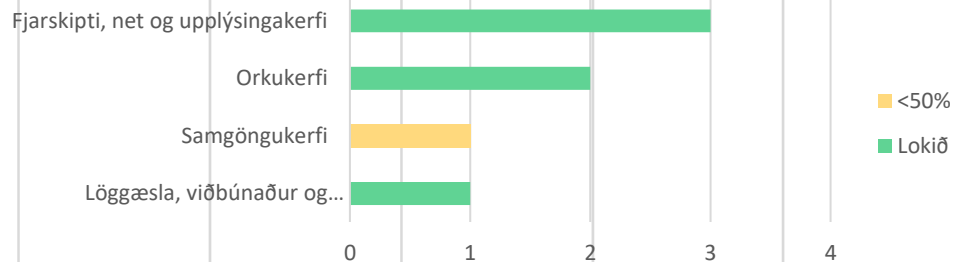

# Framvinda – Norðurland vestra

## Fjarskipti

- Samkomulag fjarskiptafélaga og Neyðarlínu
- Stoðveita 25 fjarskiptastaða og 4 sendistaða RÚV

## Orkukerfi


- Jarðstrengjavæðing dreifikerfis;
  - Glaumbæjarlína/Hegraneslína
  - Vesturhópslína
  - Einnig aðrar aðgerðir sem voru á áætlun
    - Vatnsneslína, Sauðárkrókur-Brennigerði, Sauðárkrókur-Veðramót

## Samgöngur


- Viðgerð á hafnarmannvirkjum Skarðseyri á Sauðárkróki og Skaga – nú lokið

## Löggæsla

- Varaafl

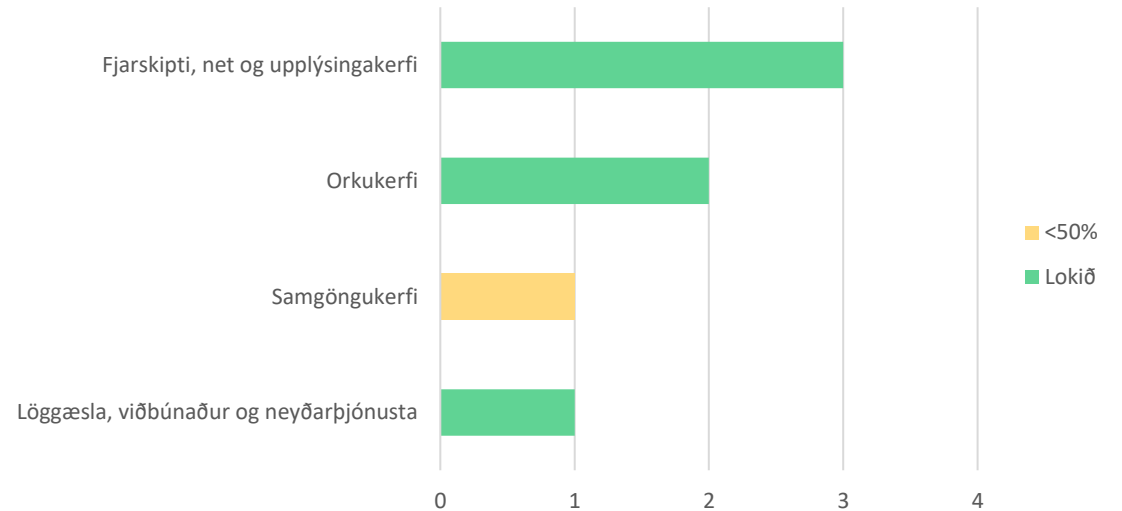


# Framvinda - landshlutar

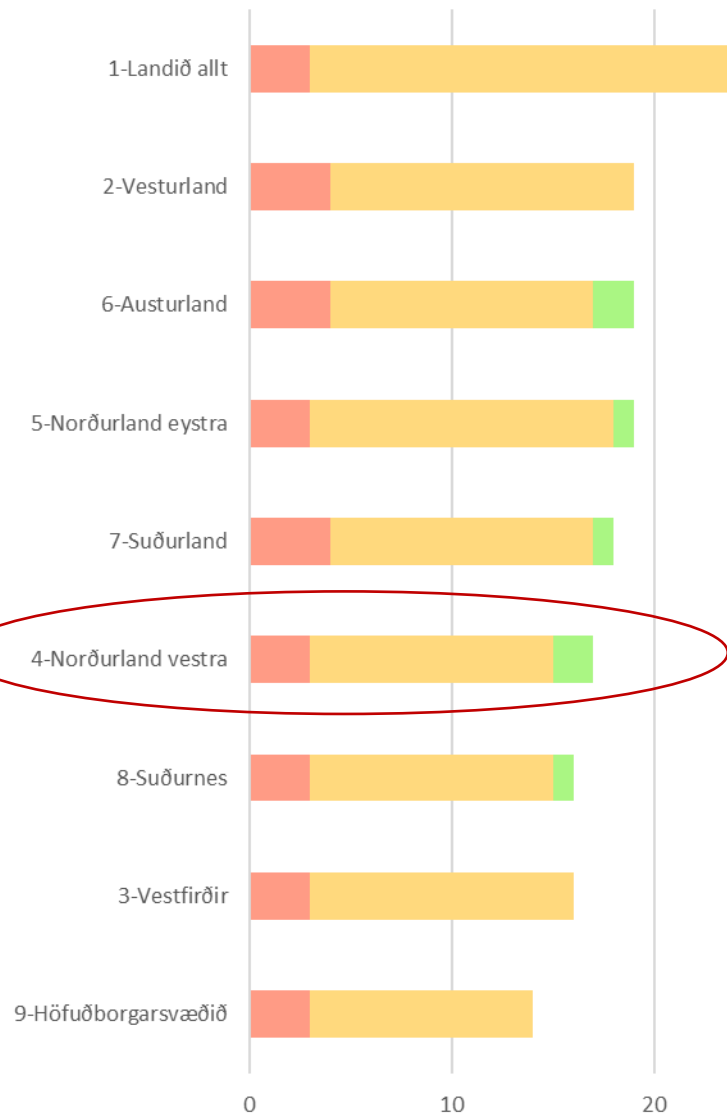

Langtímaaðgerðir

Hefjast 2020 eða síðar og lýkur 2021 eða síðar

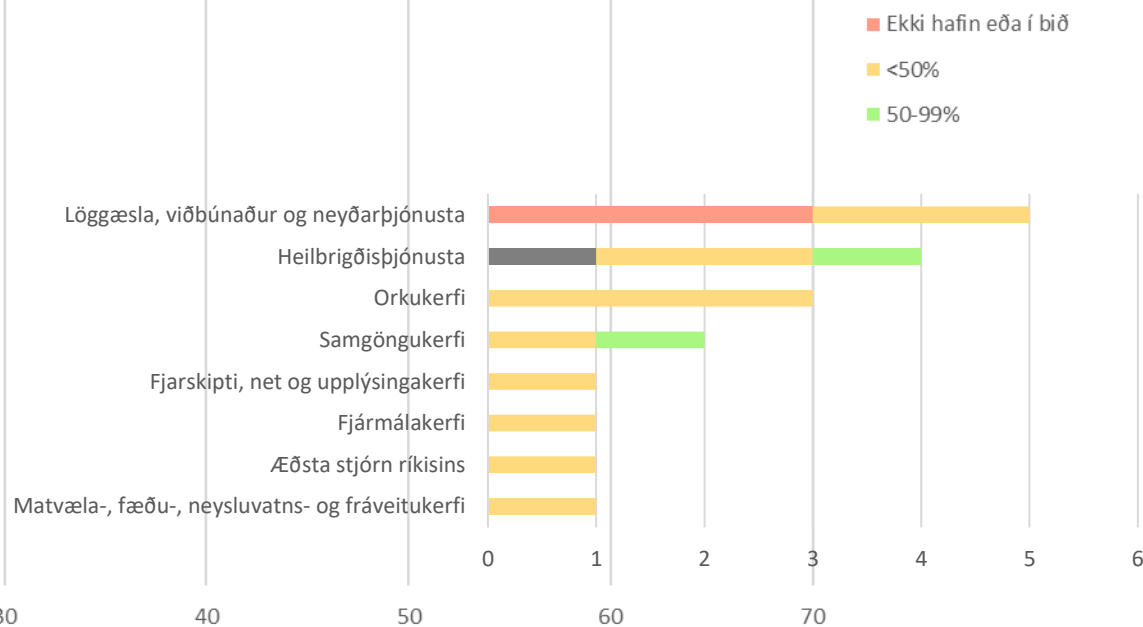

# Framvinda – Norðurland vestra

## Löggæsla

- Almannaþingin í héraði og aðstaða yfirferð og úrbætur – nú hafnar
- Samhæfing viðbragða sv.félaga í vá – félagsþjónusta, áfallahjálpi - óbreytt

## Heilbrigðisþjónusta

- Samhæfing viðbragða sv.félaga í vá – lyf færð inn í viðbragðsáætlanir heilbrigðisstofnana
- Viðbragðsgæta heilbrigðisstofnana

## Orkukerfi

- Yfirbyggt tengivirki Hrútatungu
- Jarðstrengjavæðing

## Fjarskipti

- Yfirferð tillagna sveitarfélaga - Grænbók

## Samgöngur


- Flugvallarframkvæmdir Sauðárkróki 80% og Blönduósi 100% (áætluð lok 2023)

Heilbrigðis- og félagsþjónusta, samgöngur, orkukerfi, fjármál, æðsta stjórn, matvæli, menntastofnanir, viðbragðsaðilar

- Upplýsingaöflun, mat og úrbætur á varaafli


## Langtímaaðgerðir

Hefjast 2020 eða síðar og lýkur 2021 eða síðar

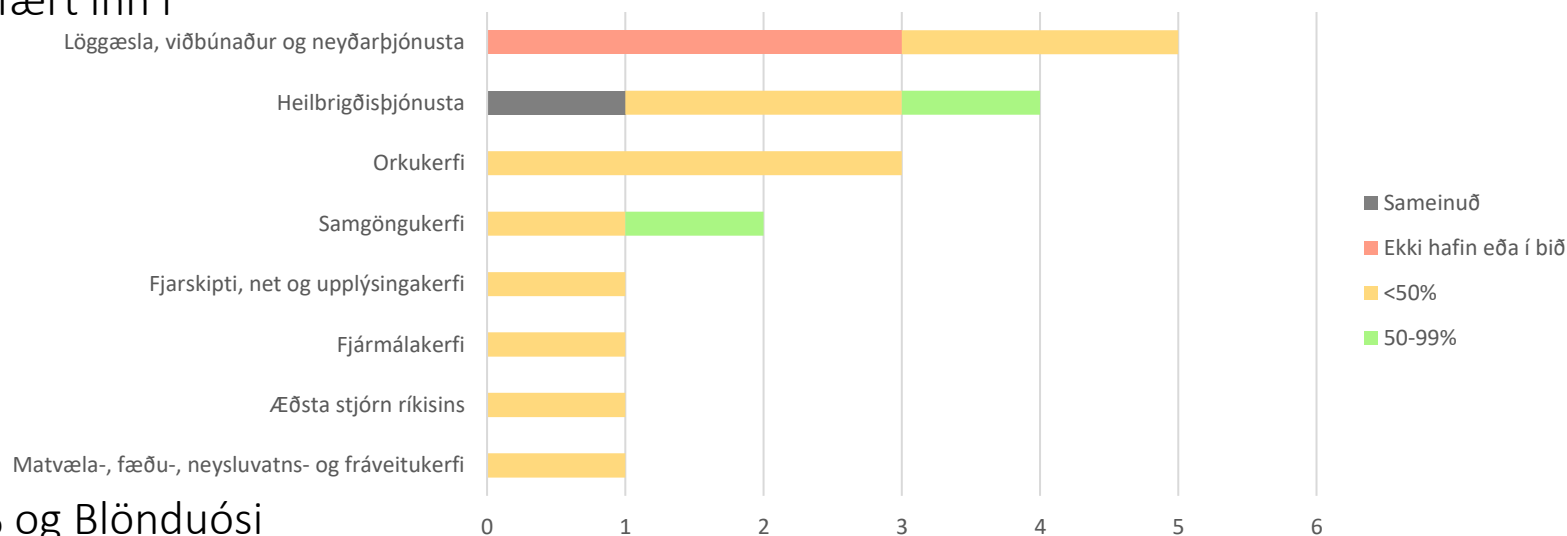

# Framvinda – Norðurland vestra

Allar aðgerðir óháð úrvinnslutíma

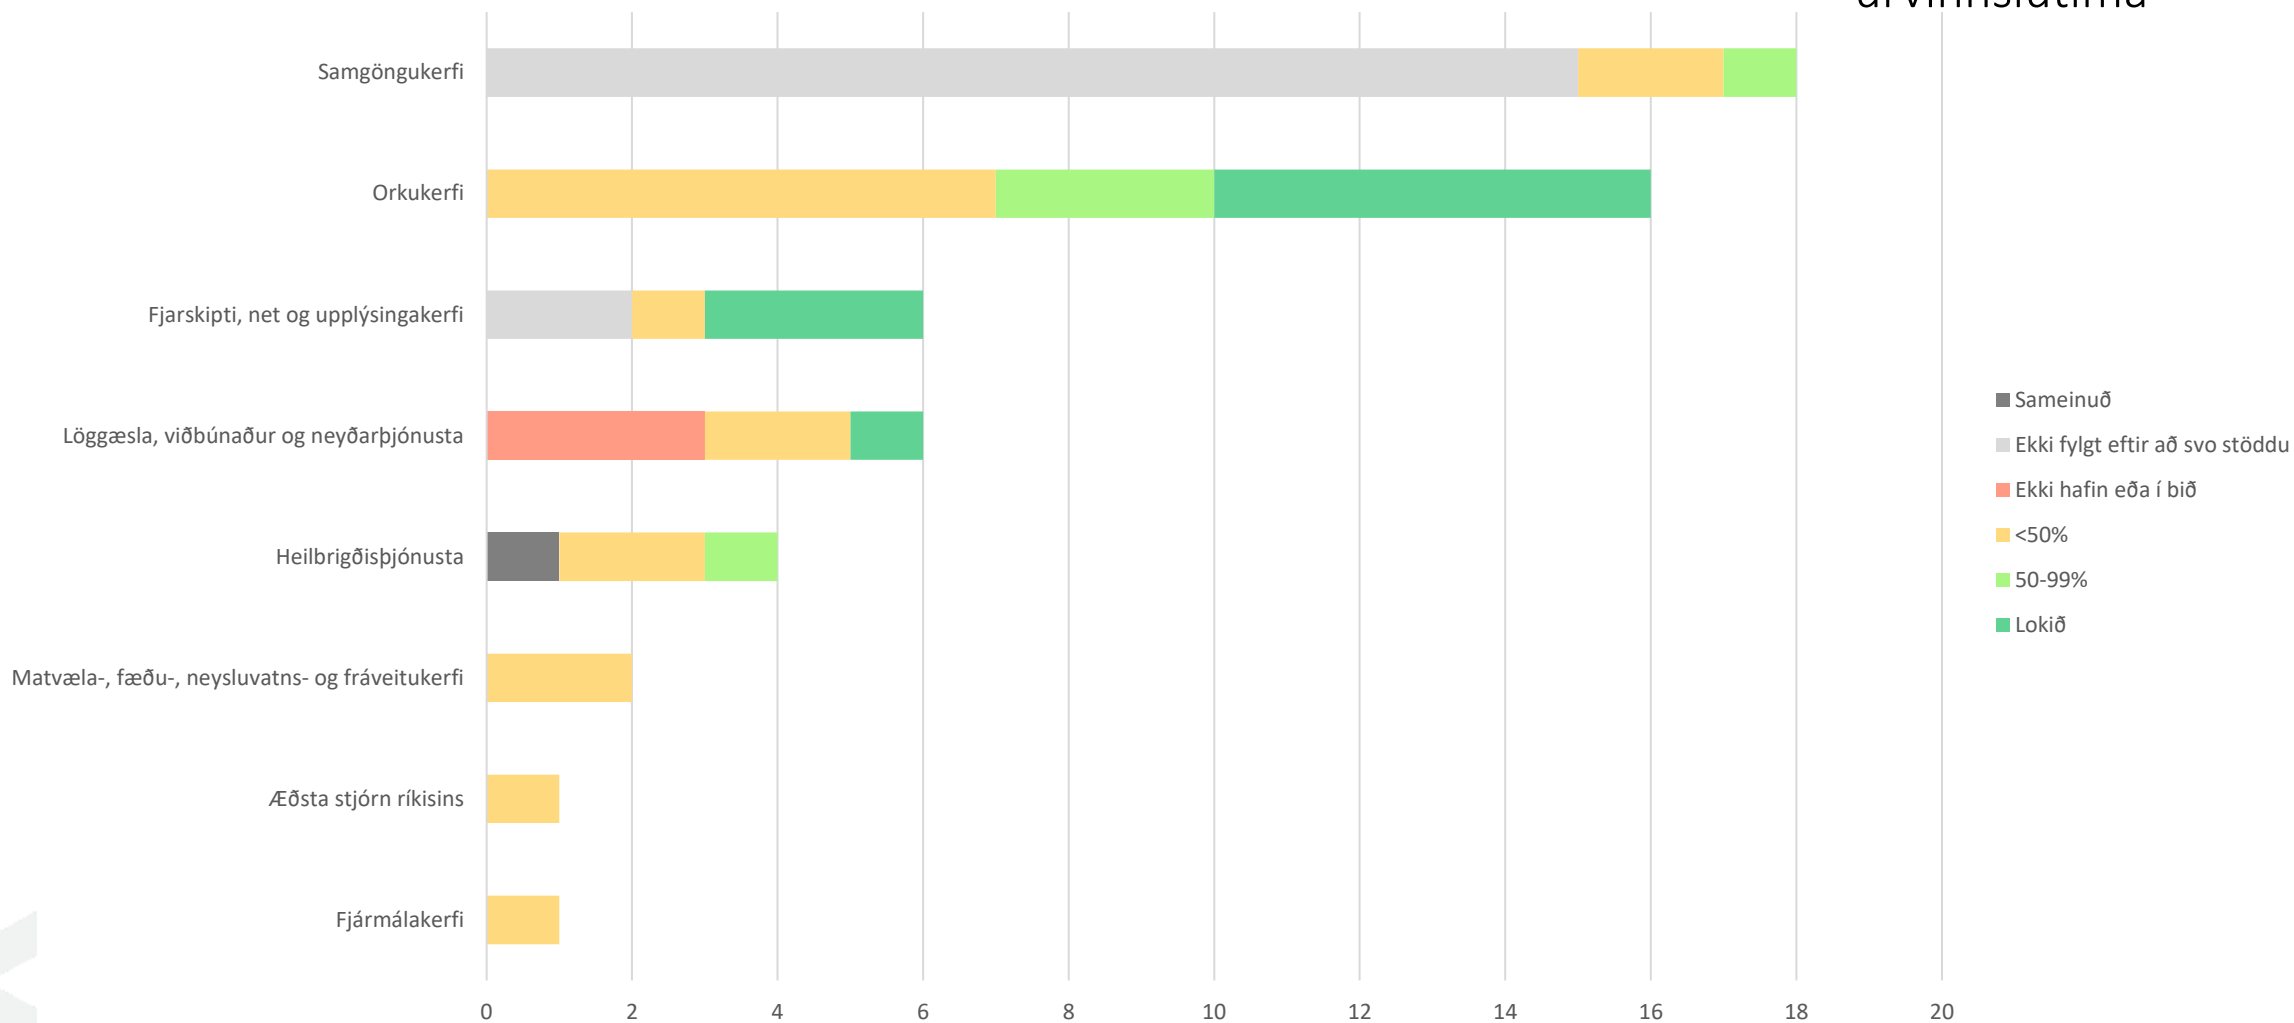



# Framvinda – Norðurland vestra

Samgöngukerfi

Samgönguaðgerðir á samgönguáætlun

## Þverárfjallsvegur

- Álit vegna MÁU liggur fyrir
- Aðalskipulag sveitarfélags hefur verið staðfest
- Samningar við landeigendur á lokametrum
- Fornleifarannsóknir í gangi í maí-júní 2021
- Stefnt á útboð í maí 2021.

## Hafnarframkvæmdir á ýmsum stöðum

Skagafjörður: Sauðárkrókur Efrigarður, Hofsós  
Norðurgarður

- Hefur verið boðið út og hefst þegar niðurstaða fæst í athugasemd smábátaeigenda

Skagaströnd: Dýpkun smábátahafnar, grjótgarður,  
Ásgarður-stálþil

- Biðstaða vegna þungatakmarkana, lýkur snemmsumars

Sauðárkrókur viðhaldsdýpkun

- Dýpkað eftir lengingu Norðurgarðs, lenging á áætlun 2021  
Blönduós, sjóvarnir vestan sláturhúss að hreinsistöð yfir á lóð  
Hafnarbrautar 1

- Áætlun haust 2021/vor2022

Skagaströnd: Réttarholt að Sjóvangi

- Haust 2022

Skagabyggð við Krók og norðanvert Kálfshamrsnes

- Boðið út haust 2021. Möguleg breyting á verkefni

Skagafjörður: Hofsós við Suðurbraut


- Verið að leita að námu svo unnt sé að hefja verkefnið

Húnaþing vestra: Borgir í Hrútafirði

Á áætlun haust 2021, bætt við sjóvörnum við Reykjaskóla í  
Hrútafirði

# Framvinda – Norðurland vestra

Fjarskipti, net og upplýsingakerfi



## Uppbygging á fjarskiptakerfum

- Ekki yfirsýn yfir aðgerðir fjarskiptafélaganna Ísland ljóstengt
- Lokaúthlutun hefur farið fram og komið til móts við allar styrkbeiðnir

## Fráveituframkvæmdir

- Auglýst eftir umsóknum frá sv.félögum um styrki í upphafi árs 2021
- Styrkir veittir fyrir lok apríl 2021

Orkukerfi



Aðgerðir á áætlun Landsnets

## Aðgerð lokið

- Viðgerð tengivirkis Hrútatungu

## Aðgerðir á áætlun 76-99%

- Sauðaárkrókslína 2 Varmahlíð Sauðárkrókur
- Tengivirki Sauðárkróki vegna tengingar SA2
- Tengivirki Varmahlíð endurnýjun vegna SA2

## Aðgerðir á langtíma áætlun

- Hrútafjörður – Blanda, ný 220kV loftlína
- Blöndulína 3 - Blanda Akureyri 220kV loftlína
- Yfirbyggt tengivirki Varmahlíð

# Framvinda – Norðurland vestra



## Dreifikerfi í jörð um áramót 2020/2021

- Skagafjörður 70%
- Húnavatnssýslur 59%


Alls 5 aðgerðum lokið á árinu 2020 (2 aðgerðir)

Ástæða munar er aldur dreifikerfis, rafvæðing seinna á ferðinni í Húnavatnssýslum en Skagafirði, eldri hlutum skipt út fyrst

## Áætlun 2021

- Skagafjörður 18 km og 5 km af Siglufjarðarlínu frá Skeiðsfossi 33kV
- Húnavatnssýslur, engin viðbót í ár

Verkefni 2020	km.
Vatnsnes vestan - Hvammstangi - Sauða - háspenna	16
Vatnsnes austan - Hörgshóll-Porfinnsstaðir - háspenna	22
Glaumbæjarlína (Sauðárkrókur - Brennigerði). Gröftur án samsíðatengingu	2,8
Skagalína (Sauðárkrókur - Veðramót) Innanbæjar á Sauðárkrók	5,4
Álma að Húsabakka Skagafirði, strenglög्न v/óveðurs des 2019	4,4
Alls	50,6

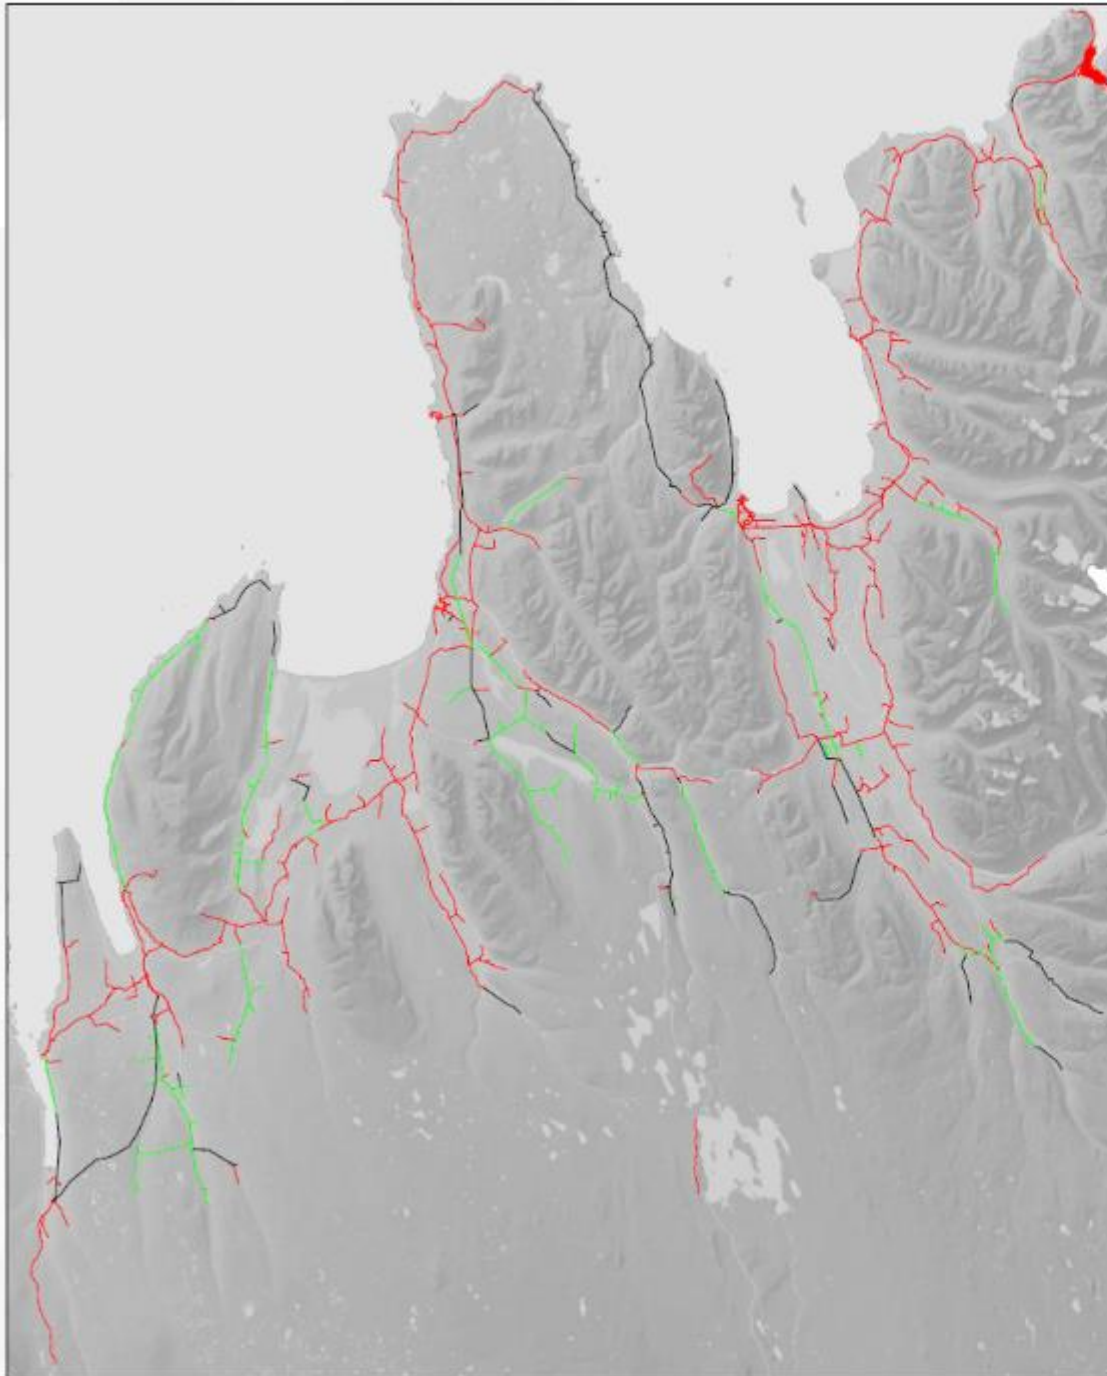

## Landið allt

- 8.500 km dreifikerfi
- Þar af 66% komið í jörð

## Stefna RARIK

- Þrífösun stærri viðskiptavina í dreifbýli >70.000 kWh
- Öll býli í ábúð með 3 fasa rafmagn 2030
- Strengvæðingu að mestu lokið 2035


Staða áætlunar í febrúar 2020

## Norðurland vestra

**Flýting jarðstrengja-væðingar á Norðurlandi vestra er 117 km sem skiptist þannig:**

- Flýtiverkefni sem voru á áætlun 2021-2025: 96 km.
  - Þar af ákveðin í kjölfar tjóns og framkvæmt 2020: 20 km.
- Flýtiverkefni sem voru á áætlun eftir 2026: 21 km.

## Lagning jarðstrengja 2020-2035

2020-2025 

2026-2035 

Komið í streng 

# Uppbygging innviða

Eftirfylgni og  
ítarefni

Næsta eftirfylgni aðgerða fyrir áramót 2021/2022

Gögn er að finna á vefsíðunni  
[www.innvidir2020.is](http://www.innvidir2020.is)

Takk fyrir

# Framsetning á niðurstöðum eftirfylgni

Aðgerðir vegna sérstakrar uppbyggingar eru flokkaðar eftir landshlutum





Súlurit lýsa aðgerðum sem:

- Hefjast og ljúka 2020 (skammtímaaðgerðir)
- Hefjast 2020 eða síðar og ljúka 2021 eða síðar (langtímaaðgerðir)

Auk þess:

- Aðgerðir fyrir orkukerfi og fjarskipti

Mat á framvindu er skilgreint sem:

	Ekki hafin eða í bið
	Í undirbúningi og á fyrri stigum vinnslu < 50%
	Á seinni stigum vinnslu > 50%
	Lokið
